PLANNING GÉNÉRAL
STEP DE PENSIER

Etat : février 2024

Team Mandataires AESC 2040
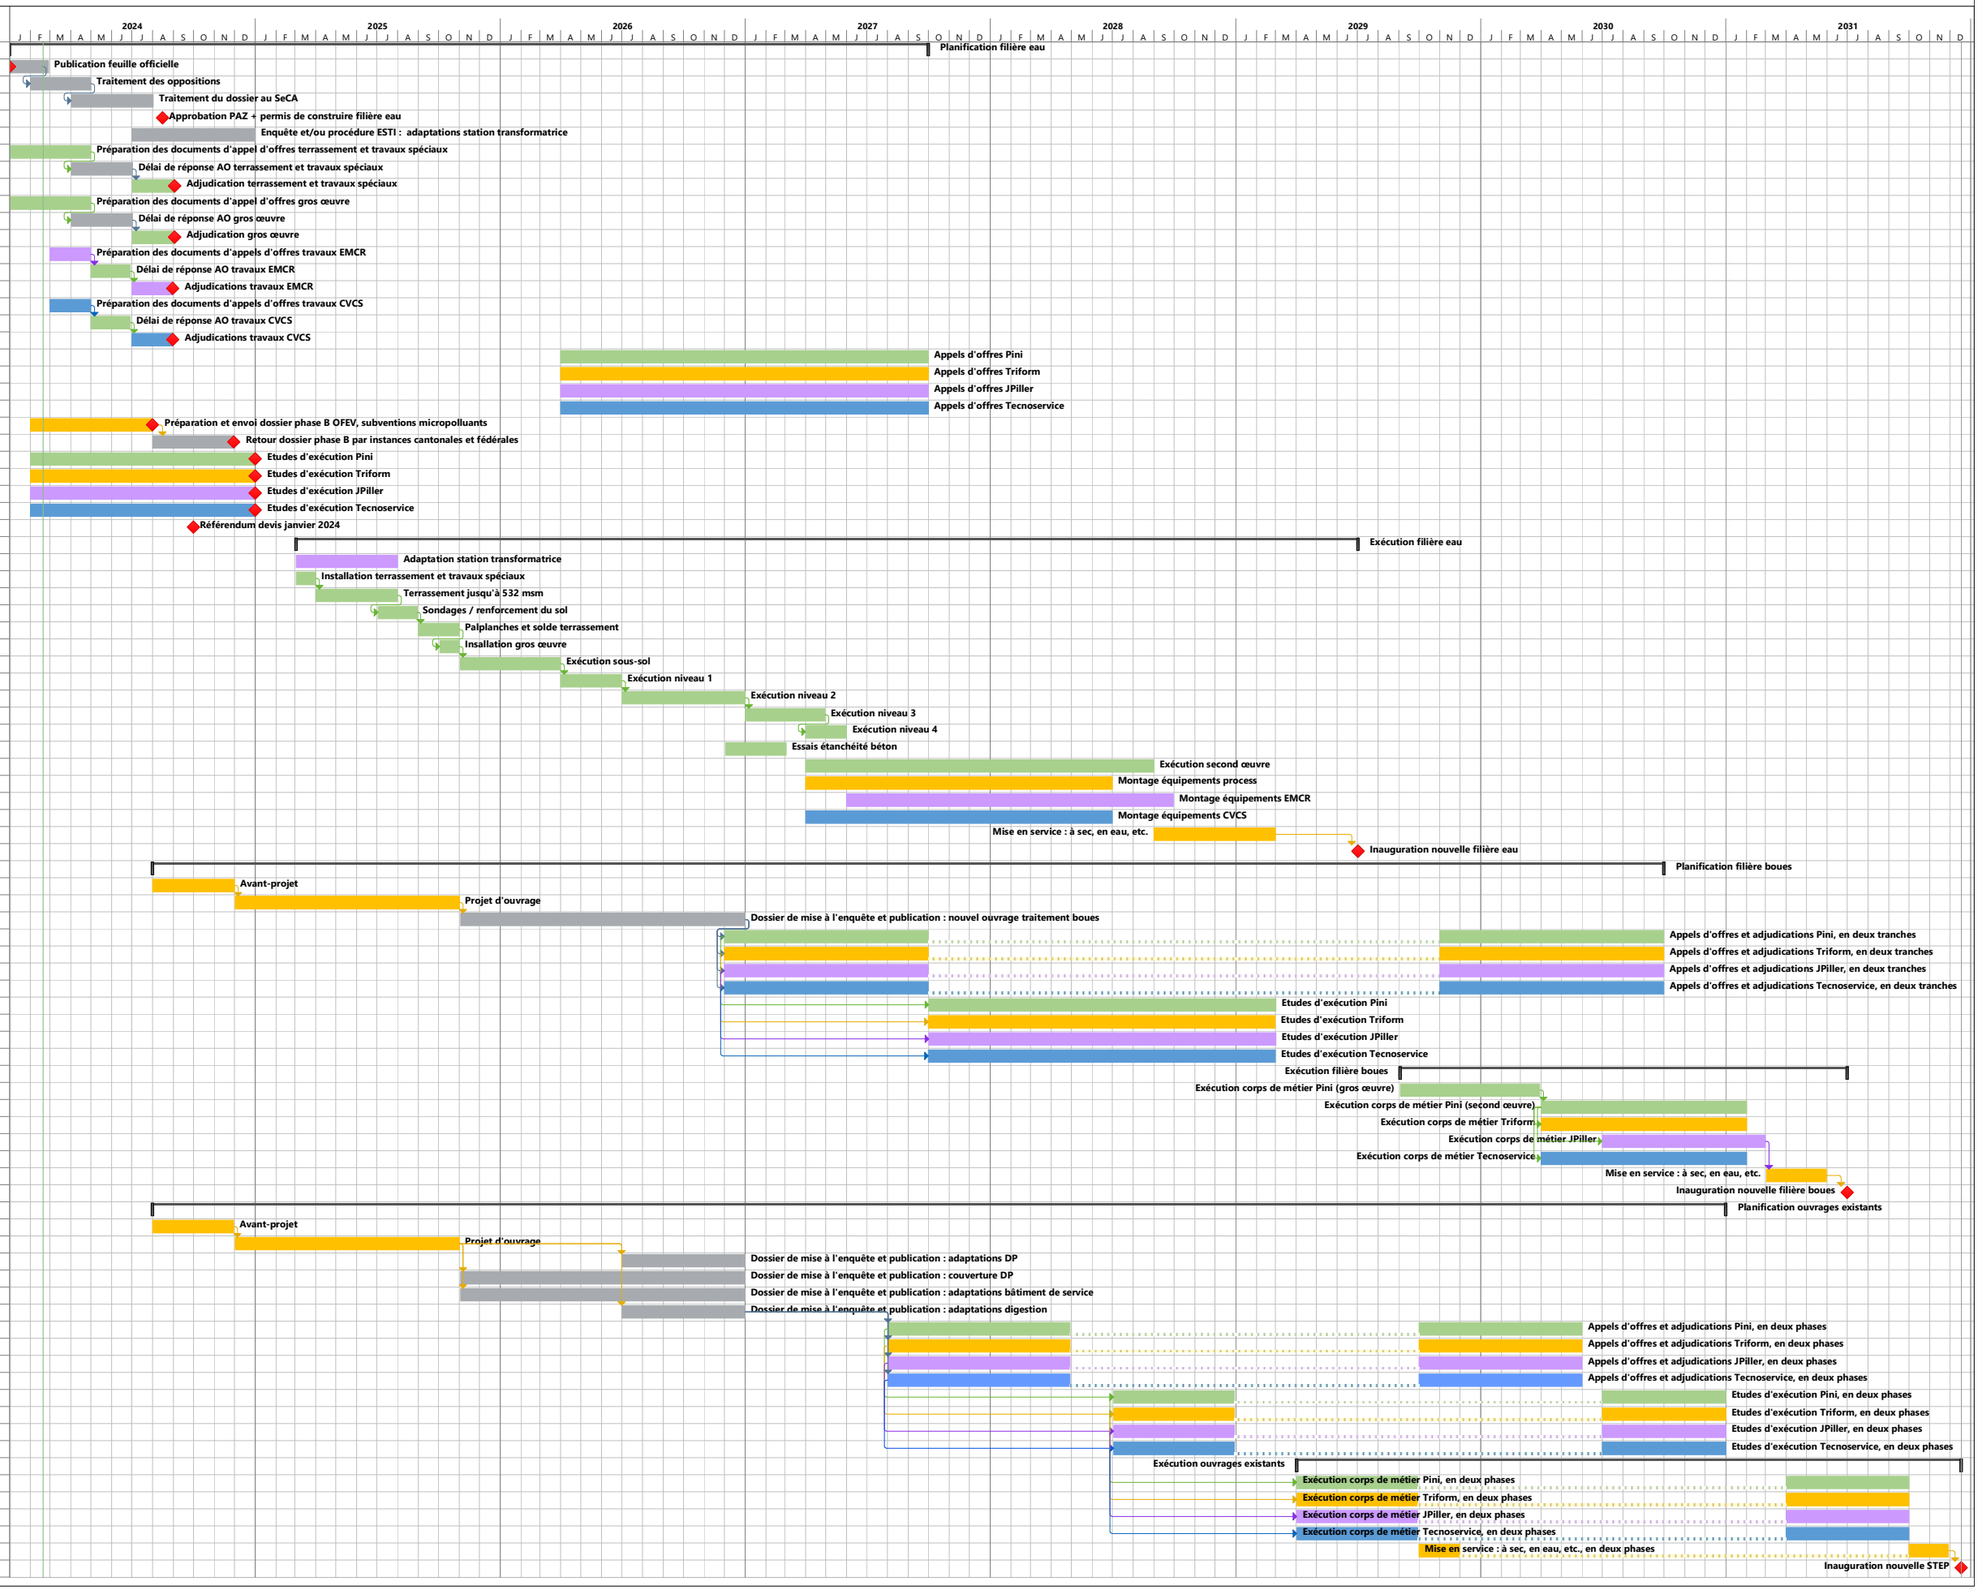
Phase SIA	Description
	Planification filière eau
33	Publication feuille officielle
33	Traitement des oppositions
33	Traitement du dossier au SeCA
33	Approbation PAZ + permis de construire filière eau
33	Enquête et/ou procédure ESTI : adaptations station transformatrice
41	Préparation des documents d'appel d'offres terrassement et travaux spéciaux
41	Délai de réponse AO terrassement et travaux spéciaux
41	Adjudication terrassement et travaux spéciaux
41	Préparation des documents d'appel d'offres gros œuvre
41	Délai de réponse AO gros œuvre
41	Adjudication gros œuvre
41	Préparation des documents d'appels d'offres travaux EMCR
41	Délai de réponse AO travaux EMCR
41	Adjudications travaux EMCR
41	Préparation des documents d'appels d'offres travaux CVCS
41	Délai de réponse AO travaux CVCS
41	Adjudications travaux CVCS
41	Appels d'offres Pini
41	Appels d'offres Triform
41	Appels d'offres JPiller
41	Appels d'offres Tecnoservice
51	Préparation et envoi dossier phase B OFEV, subventions micropolluants
51	Retour dossier phase B par instances cantonales et fédérales
51	Etudes d'exécution Pini
51	Etudes d'exécution Triform
51	Etudes d'exécution JPiller
51	Etudes d'exécution Tecnoservice
51	Référendum devis janvier 2024
	Exécution filière eau
52	Adaptation station transformatrice
52	Installation terrassement et travaux spéciaux
52	Terrassement jusqu'à 532 msm
52	Sondages / renforcement du sol
52	Palplanches et solde terrassement
52	Insallation gros œuvre
52	Exécution sous-sol
52	Exécution niveau 1
52	Exécution niveau 2
52	Exécution niveau 3
52	Exécution niveau 4
52	Essais étanchéité béton
52	Exécution second œuvre
52	Montage équipements process
52	Montage équipements EMCR
52	Montage équipements CVCS
53	Mise en service : à sec, en eau, etc.
53	Inauguration nouvelle filière eau
	Planification filière boues: nouvelle réception des boues de tiers et nouvelle déshydratation
31	Avant-projet
32	Projet d'ouvrage
33	Dossier de mise à l'enquête et publication : nouvel ouvrage traitement boues
41	Appels d'offres et adjudications Pini, en deux tranches
41	Appels d'offres et adjudications Triform, en deux tranches
41	Appels d'offres et adjudications JPiller, en deux tranches
41	Appels d'offres et adjudications Tecnoservice, en deux tranches
51	Etudes d'exécution Pini
51	Etudes d'exécution Triform
51	Etudes d'exécution JPiller
51	Etudes d'exécution Tecnoservice
	Exécution filière boues : nouvelle réception des boues de tiers et nouvelle déshydratation
52	Exécution corps de métier Pini (gros œuvre)
52	Exécution corps de métier Pini (second œuvre)
52	Exécution corps de métier Triform
52	Exécution corps de métier JPiller
52	Exécution corps de métier Tecnoservice
53	Mise en service : à sec, en eau, etc.
53	Inauguration nouvelle filière boues
	Planification ouvrages existants : bâtiment de service, décanteurs primaires, digestion, etc.
31	Avant-projet
32	Projet d'ouvrage
33	Dossier de mise à l'enquête et publication : adaptations DP
33	Dossier de mise à l'enquête et publication : couverture DP
33	Dossier de mise à l'enquête et publication : adaptations bâtiment de service
33	Dossier de mise à l'enquête et publication : adaptations digestion
41	Appels d'offres et adjudications Pini, en deux phases
41	Appels d'offres et adjudications Triform, en deux phases
41	Appels d'offres et adjudications JPiller, en deux phases
41	Appels d'offres et adjudications Tecnoservice, en deux phases
51	Etudes d'exécution Pini, en deux phases
51	Etudes d'exécution Triform, en deux phases
51	Etudes d'exécution JPiller, en deux phases
51	Etudes d'exécution Tecnoservice, en deux phases
	Exécution ouvrages existants : bâtiment de service, décanteurs primaires, digestion, etc.
52	Exécution corps de métier Pini, en deux phases
52	Exécution corps de métier Triform, en deux phases
52	Exécution corps de métier JPiller, en deux phases
52	Exécution corps de métier Tecnoservice, en deux phases
53	Mise en service : à sec, en eau, etc., en deux phases
53	Inauguration nouvelle STEP
